


RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO: 425033803



AL 31 DE ENERO DE 2014

No. EST.	PERIODO	ACTIVOS DE PRODUCCION				
		SAMARIA	MACUSPANA	MUSPAC	TOTAL	ACUMULADOS
1	14 AL 31 DE OCTUBRE 2013	\$0.00	\$3,453,581.54	\$0.00	\$3,453,581.54	\$3,453,581.54
2	01 AL 25 DE NOVIEMBRE 2013	\$1,247,682.97	\$621,500.90	\$1,379,882.81	\$3,249,066.68	\$6,702,648.22
3	01 al 31 DE DICIEMBRE 2013	\$956,779.39	\$670,271.97	\$4,078,946.44	\$5,705,997.80	\$12,408,646.02
4	01 AL 31 DE ENERO 2014	\$7,132,561.84	\$2,658,660.06	\$2,277,383.25	\$12,068,605.15	\$24,477,251.17
TOTALES.....:		\$9,337,024.20	\$7,404,014.47	\$7,736,212.50	\$24,477,251.17	
PORCENTAJES.....:		38.15%	30.25%	31.61%	100%	

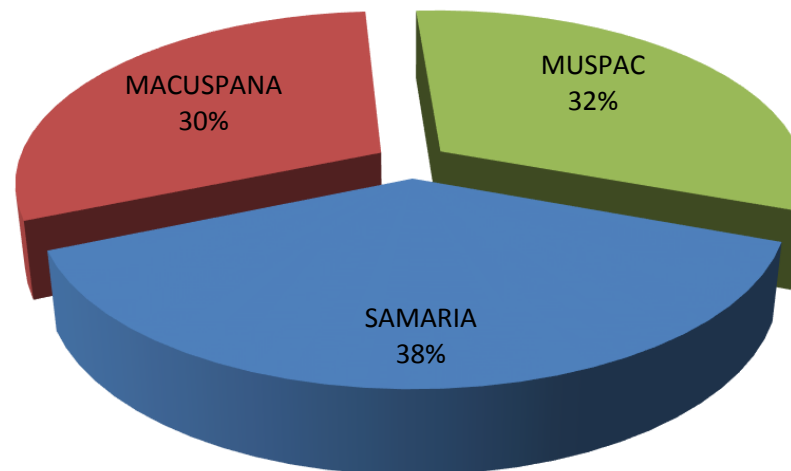

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

PLAZO (DIAS)		AVANCE FISICO	MONTOS	
ORIGINAL			CONTRATO	POR EROGAR
1765		6.23%	\$190,000,000.00	\$165,522,748.83
INICIO	TERMINO			
14/10/2013	13/08/2013			
DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS POR TRANSCURRIR			
110.00	1655.00			
